KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Jl. PATTIMURA NO. 20 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN (12110) Telp. 021-7397241 Fax. 7397241

NOTA DINAS

Nomor : 99/ND/Aj/IV/2022

Yth. : Direktur Sungai dan Pantai
Dari : Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
Hal : Permohonan Tanggapan atas Usulan Adendum Kontrak pada Kegiatan *River Improvement and Sediment Control in Paneki River* (JICA *Loan* IP-580)
Tanggal : 11 April 2022

Sehubungan dengan Surat Kepala BWS Sulawesi III pada tanggal 5 April 2022 dengan nomor PW0103/Bws13/146.1 perihal Penyampaian Adendum VI Kontrak Pekerjaan *River Improvement and Sediment Control in Paneki River*, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Status kemajuan penyerapan kegiatan terhadap DIPA TA 2022 per 31 Maret 2022 (*iEmonitoring*) masih belum ada penyerapan dari total DIPA teralokasi pada TA 2022 sebesar Rp5.890.000.000,00.
2. Usulan adendum kontrak pekerjaan sebagai berikut:

SNVT	:	Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Wilayah Sungai Palu-Lariang, Wilayah Sungai Parigi-Poso, Wilayah Sungai Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
PPK	:	PPK Sungai dan Pantai II
Nama Pekerjaan	:	River Improvement and Sediment Control in Paneki River
Nomor Kontrak	:	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/17
Tanggal Kontrak	:	5 Oktober 2020
Nilai Kontrak	:	Rp 48.943.876.000,00 (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum I	:	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/18
Tanggal Adendum I	:	1 Februari 2021
Nilai Kontrak Adendum I	:	Rp 48.943.876.000,00 (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum II	:	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/51
Tanggal Adendum II	:	11 Mei 2021
Nilai Kontrak Adendum II	:	Rp 48.943.876.000,00 (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum III	:	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/105
Tanggal Adendum III	:	29 September 2022
Nilai Kontrak Adendum III	:	Rp53.838.253.000,00 (tidak termasuk PPN 10%) penambahan 10% dari nilai kontrak
Nomor Kontrak Adendum IV	:	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/130
Tanggal Adendum IV	:	30 November 2021
Nilai Kontrak Adendum IV	:	Rp53.838.253.000,00 (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum V	:	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/141
Tanggal Adendum V	:	27 Desember 2021
Nilai Kontrak Adendum V	:	Rp53.838.253.000,00 (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum VI	:	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/15
Tanggal Adendum VI	:	15 Februari 2022
Nilai Kontrak Adendum VI	:	Rp53.838.253.000,00 (tidak termasuk PPN 10%)

3. Adendum VI dilaksanakan akibat diperlukannya penambahan waktu pelaksanaan kegiatan selama 50 hari kalender dari semula 485 (empat ratus delapan puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 berubah menjadi 535 (lima ratus tiga puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 6 April 2022 akibat adanya keterlambatan pada produksi beton dalam pengecoran beton bertulang di sekitar jembatan Kabobona (Jalan Poros Palu-Kulawi) yang masih belum tuntas dikerjakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon tanggapan teknis dan/atau persetujuan atas usulan adendum tersebut dapat disampaikan kepada kami agar kami dapat menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Strategi
Pengelolaan SDA,

Birendrajana
NIP. 19670214 199502 1001

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU
Jln. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu Telp. (0451) 482147 Fax. (0451) 482101

Nomor : PW0103/Bws13/146.1 Palu, 05 April 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 eks
Hal : Penyampaian Adendum VI Kontrak Pekerjaan
River Improvement and Sediment Control in Paneki River

Yth. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air selaku
Kepala *Project Management* Unit IRSL Sulawesi Tengah
di Jakarta

Sehubungan dengan pekerjaan *River Improvement and Sediment Control in Paneki River* yang didanai dengan Loan JICA No: IP-580, dengan hormat kami menyampaikan Adendum VI Kontrak untuk pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

SNVT	:	**Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah**
PPK	:	**Sungai dan Pantai II**
Nama Pekerjaan	:	*River Improvement and Sediment Control in Paneki River*
Nomor Kontrak Awal Tanggal Kontrak Awal Nilai Kontrak Awal	: : :	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/17 5 Oktober 2020 Rp. 48.943.876.000,- (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum I Tanggal Kontrak Adendum I Nilai Kontrak Adendum I	: : :	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/18 1 Februari 2021 Rp. 48.943.876.000,- **(Tetap)** (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum II Tanggal Kontrak Adendum II Nilai Kontrak Adendum II	: : :	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/51 11 Mei 2021 Rp. 48.943.876.000,- **(Tetap)** (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum III Tanggal Kontrak Adendum III Nilai Kontrak Adendum III	: : :	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/105 29 September 2021 Rp. 53.838.253.000,- (tidak termasuk PPN 10%) **(Penambahan sebesar 10% dari Nilai Kontrak)**
Nomor Kontrak Adendum IV Tanggal Kontrak Adendum IV Nilai Kontrak Adendum IV	: : :	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/130 30 November 2021 Rp. 53.838.253.000,- **(Tetap)** (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum V Tanggal Kontrak Adendum V Nilai Kontrak Adendum V	: : :	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/141 27 Desember 2021 Rp. 53.838.253.000,- **(Tetap)** (tidak termasuk PPN 10%)
Nomor Kontrak Adendum VI Tanggal Kontrak Adendum VI Nilai Kontrak Adendum VI	: : :	HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/15 15 Februari 2022 Rp. 53.838.253.000,- **(Tetap)** (tidak termasuk PPN 10%)

Adendum I kontrak dilaksanakan karena adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 59/KPTS/M/2021, tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan tidak ada perubahan nilai dan volume kontrak serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Dalam Adendum II jangka waktu pelaksanaan semula 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 menjadi 408 (Empat Ratus Delapan) Hari Kalender sampai dengan tanggal 30 November 2021. Adanya penambahan waktu disebabkan

oleh keterlambatan *Notice Regarding Contract* (NRC) dari JICA dan penambahan item pekerjaan dan *output* pekerjaan.

Adendum III dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan desain sekitar Jembatan Kabobona (Jalan Poros Palu – Kulawi) yang semula beton siklop menjadi beton bertulang;
2. Terdapat penyesuaian volume pekerjaan sesuai desain terhadap kondisi *existing*;
3. Penambahan *output* pekerjaan drainase, jembatan desa, *dam* pengunci dan *channel work* di hulu dan hilir sungai, dengan panjang semula 3.380 m menjadi 4.246 m;
   a. Pada bagian *upstream* pekerjaan *channel work* direncanakan penambahan output sepanjang 227 m;
   b. Pada hilir sungai terdapat penambahan *channel work* sepanjang 100 m, kemudian akan dibuatkan *dam* pengunci;
   c. Pada hilir sungai setelah *dam* pengunci dibuat *channel work* satu sisi sepanjang 539 m untuk mengarahkan aliran sampai ke sungai utama (sungai Palu).

Adendum IV jangka waktu pelaksanaan semula 408 (Empat Ratus Delapan) Hari Kalender sampai dengan tanggal 30 November 2021 menjadi 435 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima) Hari Kalender sampai dengan tanggal 27 Desember 2021. Adanya penambahan waktu disebabkan oleh penambahan *output* pekerjaan pada sisi kiri hilir sungai berupa tanggul dengan struktur beton siklop sepanjang 465 m dan struktur batu *boulder* sepanjang 93,91 m di bagian hulu sungai, tanpa merubah nilai kontrak. Pembiayaan pekerjaan ini berasal dari penyesuaian kembali volume setiap item pekerjaan di lapangan.

Dalam Adendum V jangka waktu pelaksanaan semula 435 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima) Hari Kalender sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 menjadi 485 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hari Kalender sampai dengan tanggal 15 Februari 2022. Adanya penambahan waktu disebabkan oleh :

1. Terdapat pekerjaan tambah kurang karena pekerjaan tangga mandi hewan berkurang dialihkan menjadi pekerjaan *channel work* konstruksi batu *boulder* sepanjang 93,91 m di bagian hulu dan hilir sungai;
2. Tahapan pekerjaan jembatan desa yang menunggu usia beton dan channel work beton bertulang di sekitar jembatan Kabobona (Jalan Poros Palu-Kulawi) yang ruang kerjanya berdekatan dengan pemukiman, sehingga membutuhkan waktu dan kehati-hatian.

Adendum VI dilaksanakan akibat adanya keterlambatan pada produksi beton dalam pengecoran beton bertulang di sekitar jembatan Kabobona (Jalan Poros Palu-Kulawi) yang masih belum tuntas dikerjakan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, sehingga Kontraktor Pelaksana diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (Lima Puluh) Hari Kalender, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 6 April 2022, disertai denda 1/1000 (satu per seribu) setiap harinya atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak.

Kami mohon bantuan Bapak Direktur untuk berkenan menyampaikan Dokumen Adendum VI Kontrak tersebut kepada pihak JICA (*Japan International Cooperation Agency*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III

TAUFIK, S.S.T., M.T.
NIP 19701231 199803 1 037

Tembusan :

1. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA;
2. Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai, Ditjen SDA;
3. Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Sungai dan Pantai, Ditjen SDA.

EXPLANATORY NOTE

FOR ADDENDUM CONTRACT NO. 06

LOAN IP-580

INFRASTRUCTURE SECTOR LOAN (IRSL) IN CENTRAL SULAWESI

THE PACKAGE OF
RIVER IMPROVEMENT AND SEDIMENT CONTROL
IN PANEKI RIVER

DIRECTORATE GENERAL OF WATER RESOURCES
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

TABLE OF CONTENT

I. INTRODUCTIONS 3

II. PROJECT 3

A. BACKGROUND OF THE PROJECT 3

B. THE PURPOSE OF THE PROJECT 3

C. DATA OF LOAN 3

D. GENERAL OVERVIEW OF THE PROJECT 4

E. SCOPE OF WORK 4

F. LOCATION MAP 4

G. BILL OF QUANTITY 5

III. IMPLEMENTATION OF THE PROJECT 5

A. CHRONOLOGY OF THE CONTRACT 5

IV. ADJUSTMENTS FOR CHANGES IN DURATION 6

A. BACKGROUND 6

B. EVALUATION BY TECHNICAL TEAM OF THE BWS SULAWESI III PALU ... 7

V. CONCLUSION 7

I. INDTRODUCTION

The package of River Improvement And Sediment Control In Paneki River is one of the packages under Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) within Loan Agreement No. IP-580. This packages build 1 unit Consolidation Dam, 1 unit Locking Dam at the downstream and 4.246 Km Channel Work. The contract was signed on 05 Oktober 2020 and the work has commenced since the notice to proceed on 19 october 2020. The First Addendum was signed on 1 February 2021 due to a change in the Commitment making officer (PPK). The Second Addendum was signed on 11 May 2021 due to the addition of the work implementation period until 30 November 2021. The Third Addendum was signed on 29 September 2021 due to the addition of work items whish resulted in an increase in the contract value of 10% of the original contract. The 4th Addendum regarding the addition of 27 Calendar Days. The Addendum 5th regarding the addition of 50 calendar days of work execution. And this addendum is an opportunity to complete work for 50 calendar days accompanied by payment of delay damage in accordance with what has been determined in the General Terms Of The Contract and The Specific Terms Of The Contract.

II. PROJECT

A. Background of The Project

On September 28, 2018 there was a devasting earthquake, tsunami, and liquefaction wich occurred in Central Sulawesi. The Japan International Cooperation Agency (JICA) supporting the Government of Indonesia through the infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) No IP-580. One of packages in this loan is the package of River Improvement and sediment control in paneki river. The paneki river, which is included in this sub-project, experienced silting of the riverbed and river embankment erosion due to the September 28,2018 earthquake which brought liquefaction materials.

B. The Purpose of The Project

- Sediment control in paneki river
- Strengthening of the paneki river embankment of paneki river
- Repair the paneki river in kabobona village and langaleso village, Dolo District, Sigi Regency Central Sulawesi Province

C. Data of Loan

Loan Agreement for infrastructure reconstruction sector loan (IRSL) in central Sulawesi between japan international cooperation agency (JICA) and government of the Republic of Indonesia (GOI) No.IP-580 was signed on January 9. 2020.

The objective of the project is to reconstruct infrastructure and facilities damaged by the Central Sulawesi province earthquake under build back better concept thereby contributing to the recovery of life and economy of the affected communities with disaster preparedness.

The executing agency is the Directorate General Water Resources, Ministry Of Public Works And Housing.

D. General Overview of The Project

1. BWS : Sulawesi III Palu

2.	SNVT	: PJSA Central Sulawesi
3.	PPK	: Sungai dan Pantai II
4.	Loan No.	: IP-580
5.	Package Name	: River Improvement And Sediment Control In Paneki River
6.	Original Contract Amount	: IDR 48.943.876.000,00
7.	Addendum I Contract Amount	: IDR 48.943.876.000,00 (Remain)
8.	Addendum II Contract Amount	: IDR 48.943.876.000,00 (Remain)
9.	Addendum III Contract Amount	: IDR 53.838.253.000,00 (10% added value)
10.	Addendum IV Contract Ammount	: IDR 53.838.253.000,00 (Remain)
11.	Addendum V Contract Ammount	: IDR 53.838.253.000,00 (Remain)
12.	Contractor	: PT. Karya Pembangunan Rezki
13.	Contract No.	: HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/17
14.	Contract Date	: 5 Oktober 2020
15.	Addendum I No.	: HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/18
16.	Addendum I Date	: 01 February 2021
17.	Addendum II No.	: HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/51
18.	Addendum II Date	: 11 May 2021
19.	Addendum III No.	: HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/105
20.	Addendum III Date	: 29 September 2021
21.	Addendum IV No.	: HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/130
22.	Addendum IV Date	: 30 November 2021
23.	Addendum V No.	: HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/141
24.	Addendum V Date	: 27 December 2021
25.	Addendum VI No.	: HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/15
26.	Addendum VI Date	: 15 Februari 2022
27.	Notice of Proceed Date	: 19 Oktober 2020
28.	Original Contract Duration	: 210 Days
29.	Addendum I Contract Duration	: 210 Days
30.	Addendum II Contract Duration	: 408 Days
31.	Addendum III Contract Duration	: 408 Days
32.	Addendum IV Contract Duration	: 435 Days
33.	Addendum V Contract Duration	: 485 Days
34.	Addendum VI Contract Duration	: 535 Days
35.	Original Contract PHO Date	: 16 May 2021
36.	Addendum I PHO Date	: 16 May 2021
37.	Addendum II PHO Date	: 30 November 2021
38.	Addendum III PHO Date	: 30 November 2021
39.	Addendum IV PHO Date	: 27 December 2021
40.	Addendum V PHO Date	: 15 February 2022
41.	Addendum VI PHO Date	: 6 April 2022
42.	Warranty Period	: 180 Days

E. Scope of Work

1. Cyclop Concrete
2. Excavation Earth Work
3. Concrete K-225

F. Location Map

The package is located in Langaleso Village and Kabobona Village, Dolo District, Sigi Regency Central Sulawesi Province. The map is outline below:

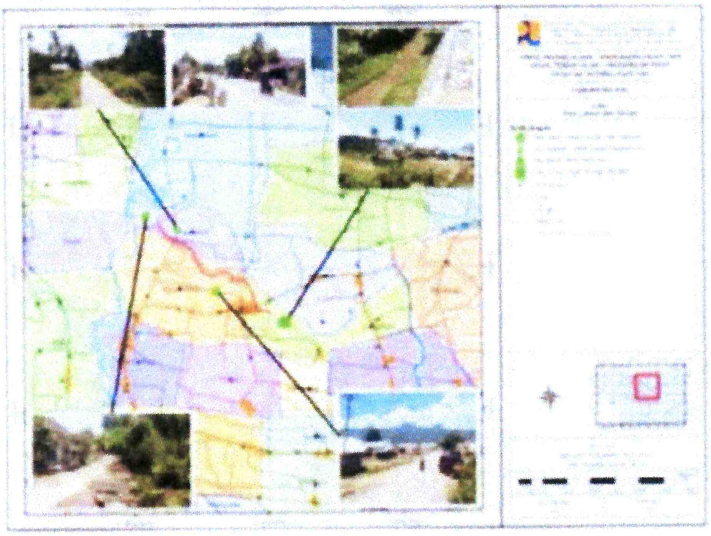

Figure 1. Project Location

G. Bill of Quantity

NO	DESCRIPTION	TOTAL PICE (IDR)
1	PREPARATORY WORK	557.370.000,00
2	OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM	91.440.000,00
3	CHANNEL WORK	51.022.755.113,80
4	CONSOLIDATION DAM	1.406.891.307,94
5	VILLAGE BRIDGE	395.446.324,70
6	BOX CULVERT	364.350.685,53
TOTAL		53.838.253.431,96
	ROUNDED DOWN	**53.838.253.000,00**
# FIFTY THREE BILLION EIGHT HUNDRED THIRTY EIGHT MILLION TWO HUNDRED FIFTY THREE THOUSAND RUPIAH		

III. IMPLEMENTATION OF THE PROJECT

A. Chronology Of The Contract

During the works implementation of the package of River Improvement and Sediment Control in Paneki River, there are several changes that already stipulated in the contract addendum as follows:

NO	ACTIVITY	DATE	EXPLANATION
1	Original Contract	05 Oktober 2020	- Original Contract - Contract Amount : IDR: 48.943.876.000,00 - Construction Duration : 210 Days
2	Addendum I	01 February 2021	- Change of Committees (PPK) - Contract Amount : IDR: 48.943.876.000,00 **(remain)** - Construction Duration : 210 Days **(remain)**
3	Addendum II	11 May 2021	- Contract Amount : IDR: 48.943.876.000,00 **(remain)** - Change of Construction Duration : 408 Days
4	Addendum III	29 September 2021	- Additional Work Items - Contract Amount : IDR: 53.838.253.000,00 - Construction Duration : 408 Days
5	Addendum IV	30 November 2021	- Contract Amount : IDR: 53.838.253.000,00 **(remain)** - Change of Construction Duration : 435 Days
6.	Addendum V	27 December 2021	- Contract Amount : IDR: 53.838.253.000,00 **(remain)** - Change of Construction Duration : 485 Days
7	Addendum VI	15 February 2022	- Giving the opportunity to complete the work for 50 calendar days accompanied by payment of delay damage in accordance with those specified in the general terms of the contract and the specific terms of the contract

IV. ADJUSMENTS FOR CHANGE

A. Background

In accordance with what is stated in the General Terms Of The Contract Part B6, number 45 regarding the Granting of Opportunities:

45.1 In the event that it is estimated that the service provider has failed to complete the work until the Execution Period ends, but the PPK judges that the Provider is able to complete the work, the PPK may provide an opportunity for the Service Provider to complete the work.

45.2 The provision of opportunities for the Provider to complete the work is contained in an addendum to the Contract which regulates:

a. the time of giving the opportunity to complete the work;

b. imposition of penalties for lateness to the Provider;

c. extension of the validity period of the Implementation Guarantee; and

d. source of funds to finance

Completion of the remaining work which will be continued to the next Fiscal Year from the DIPA of the next Fiscal Year, if the grant of opportunity exceeds the Fiscal Year.

45.3 Providing opportunities for service providers to complete work up to 50 (fifty) calendar days, from the end of the Implementation Period

45.4 Giving the opportunity to the Provider to complete the work may exceed the Fiscal Year

The following is a historical overview of the proposed additional time addendum to the River Improvement And Sediment Control In Paneki River work:

1. The package was contracted on October 05,2020. The First Addendum was signed on 1 February 2021 due to a change in the Commitment making officer (PPK). The Second Addendum was signed on 11 May 2021 due to the addition of the work implementation period until 30 November 2021. The Third Addendum was signed on 29 September 2021 due to the addition of work items whish resulted in an increase in the contract value of 10% of the original contract. The 4th Addendum was signed on 30 November 2021 due to the addition of the work implementation period until 27 December 2021. The 5th Addendum was signed on 27 December 2021 due to the addition of the work implementation period until 15 February 2022.
2. On February 14, 2022, PPK Sungai and Pantai 2 issued a notification letter for follow-up work by providing an opportunity accompanied by a fine for late completion of the work in accordance with the clause in the contract document to the Branch Manager of PT. Karya Pembangunan Rezki
3. On February 14, 2022, PT. Karya Pembangunan Rezki replied to PPK's letter by submitting an application for granting opportunities.

B. Evaluation by Technical Team of The BWS Sulawesi III Palu

Based on the results of the field inspection and the results of the presentation of the construction service provider's work plan, it was agreed to increase the time for the execution of the work from 485 days to 535 calendar days starting from February 16, 2022, accompanied by a fine every working day in accordance with what has been stipulated in the special terms of the contract.

V. CONCLUSION

1. There is an increase in the time to carry out work from 485 days to 535 days as of the issuance of a SPMK on October 19,2021 due to the addition of work results in the downstream area of the Paneki River.
2. There has been an increase in the execution time of the work from 485 days to 535 days starting from February 16, 2022 to April 6, 2022 (for 50 calendar days) accompanied by a fine for late completion of the work.
3. 2. Payment of fines will be deducted at the last proposed term as stated in the general terms of the contract.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR
WS. PALU-LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu (94114), Telp. (0451) - 482147 Fax (0451) - 482101

ADENDUM KONTRAK KE - VI (ENAM)

Nomor : HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/15
Tanggal 15 Februari 2022

ATAS

CONTRACT	SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Unit Price	Harga Satuan

Nomor : HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/17
Tanggal : 05 Oktober 2020

Package – Paket Pekerjaan :
River Improvement and Sediment Control In Paneki River

Location – Lokasi
Kabupaten Sigi

Sourch – Sumber Dana
JICA LOAN IP-580

Fiscal Year – Tahun Anggaran
2020-2022

Antara
PPK SUNGAI DAN PANTAI II
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR
WS. PALU-LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN

PT. KARYA PEMBANGUNAN REZKI
Jl. MW. Maramis Lingk. III Kairagi I
MANADO

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR
WS. PALU-LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu (94114), Telp. (0451) - 482147 Fax (0451) - 482101

ADENDUM KONTRAK KE - VI (ENAM)

HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/15
Tanggal : 15 Februari 2022

Paket Pekerjaan Konstruksi :

River Improvement and Sediment Control In Paneki River

ADENDUM KE - VI atas SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan ***River Improvement and Sediment Control in Paneki River*** nomor : HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/17 Tanggal 05 Oktober 2020, antara :

Nama	: Rangga Ardiansah, S.H.,S.T
NIP	: 197803312009111002
Jabatan	: PPK Sungai dan Pantai II
Berkedudukan di	: Jl. Abd. Rahman Saleh No.230, Palu

"Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 59/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut "**Pengguna Jasa**", dengan:

Nama	: Bernard Hendra Wentinusa
Jabatan	: Pimpinan Cabang
Berkedudukan di	: Jl. MW. Maramis Lingk. III Kairagi I Manado
Akta Notaris Nomor	: 101 (Seratus Satu)
Tanggal	: 31 Maret 2003
Notaris	: Sukma Nurani Amperia, SH
Perubahan Akta Notaris	
Akta Notaris Nomor	: 25 (Dua Puluh Lima)
Tanggal	: 24 Maret 2020
Notaris	: Taufiq Arifin, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT.KARYA PEMBANGUNAN REZKI selanjutnya disebut **Penyedia Jasa**".

Paraf
Pihak ke 1 Pihak ke 2

MENGINGAT BAHWA :

(a) PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**.

(b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian professional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini .

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili.

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing–masing pihak :

1) Telah senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat.
2) Menandatangani Kontrak ini telah meneliti secara patut.
3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini.
4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini berserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

DENGAN BERDASARKAN PADA:

1. *Notice Regarding Contract*, Paket Pekerjaan Konstruksi *River Improvement and Sediment Control in Paneki River* Nomor : IP-580/C-007, tanggal 14 Januari 2021, JICA;
2. Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi *River Improvement and Sediment Control in Paneki River* Nomor : HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/17, tanggal 05 Oktober 2020;
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan Konstruksi *River Improvement and Sediment Control in Paneki River* Nomor : HK020/SPMK/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/17A, tanggal 19 Oktober 2020;
4. DIPA Awal Nomor : SP DIPA – 033.06.1.498290/2020 tanggal 23 November 2020; Revisi ke 1 DIPA Nomor : SP DIPA – 033.06.1.498290/2020 tanggal 01 Februari 2021; Revisi ke 2 DIPA Nomor : SP DIPA – 033.06.1.498290/2020 tanggal 25 Februari 2021; Revisi ke 3 DIPA Nomor : SP DIPA – 033.06.1.498290/2020 tanggal 26 April 2021;
5. Adendum I Surat Perjanjian Nomor : HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/18, tanggal 01 Februari 2021;
6. Adendum II Surat Perjanjian Nomor : HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/51, tanggal 11 Mei 2021;
7. Adendum III Surat Perjanjian Nomor : HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/105, tanggal 29 September 2021;
8. *Notice Regarding Contract*, Paket Pekerjaan Konstruksi *River Improvement and Sediment Control in Paneki River* Nomor: IP-580/C-007-001, tanggal 23 November 2021, JICA;
9. Adendum IV Surat Perjanjian Nomor : HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/130, tanggal 30 November 2021;
10. Adendum V Surat Perjanjian Nomor : HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/141, tanggal 27 Desember 2021;
11. Surat PPK Sungai dan Pantai II Nomor : SA0401/SP.II-PJSA.ST/Bws13/13, tanggal 10 Februari 2022 Perihal Persiapan PHO;

Paraf	
Pihak ke 1	Pihak ke 2

12. Surat PPK Sungai dan Pantai II Nomor : SA0401/SP.II-PJSA.ST/Bws13/14, tanggal 14 Februari 2022 Perihal Pemberitahuan Tindaklanjut Penyelesaian Pekerjaan River Improvement and Sediment Control in Paneki River;
13. Surat PT. Karya Pembangunan Rezki Nomor: 59/PT.KPR/Permit/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 Perihal Permohonan Pemberian Kesempatan.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Konstruksi **River Improvement and Sediment Control In Paneki River** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
(Tetap)

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
(Tetap)

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(Tetap)

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

SEMULA:

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya, berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personil manajerial dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

Huruf a. Adendum V Surat Perjanjian;

Huruf b. Surat Perjanjian;

Huruf c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;

Huruf d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;

Huruf e. Syarat-syarat Umum Kontrak;

Paraf	
Pihak ke 1	Pihak ke 2

Huruf f. Spesifikasi Tekis; dan

Huruf g. Gambar-Gambar

MENJADI :

(1) (Tetap)

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

Huruf a. Adendum VI Surat Perjanjian;

Huruf b. Tetap;

Huruf c. Tetap;

Huruf d. Syarat-syarat Khusus Kontrak diubah dan dibaca seperti terlampir;

Huruf e. Tetap;

Huruf f. Tetap;

Huruf g. Tetap

(3) Dalam masa penyelesaian sisa pekerjaan penyedia barang/jasa dikenakan Denda Keterlambatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan di SSKK.

Pasal 5
MASA KONTRAK

SEMULA :

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung Sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai Dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **485 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima)** hari kalender;

3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

MENJADI :

1. (Tetap)

2. (Tetap)

3. (Tetap)

Paraf	
Pihak ke 1	Pihak ke 2

4. Masa waktu Pemberian Kesempatan sisa Pekerjaan selama **50 (lima Puluh) hari kalender** sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 6 April 2022;

5. Penyedia Jasa membuat perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sampai tanggal 6 April 2022;

Dengan demikian Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa telah bersepakat untuk menandatangani Adendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama	Untuk dan atas nama
PT. KARYA PEMBANGUNAN REZKI	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
Penyedia,	**PPK Sungai dan Pantai II,**
METERAI TEMPEL 10000 ADSCDAJX704860245	
Bernard Hendra Wentinusa	**Rangga Ardiansah, S.H., S.T**
Pimpinan Cabang	NIP. 19780331 200911 1 002

4. Masa waktu Pemberian Kesempatan sisa Pekerjaan selama **50 (lima Puluh) hari kalender** sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 6 April 2022;

5. Penyedia Jasa membuat perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sampai tanggal 6 April 2022;

Dengan demikian Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa telah bersepakat untuk menandatangani Adendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama	Untuk dan atas nama
PT. KARYA PEMBANGUNAN REZKI	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah
Penyedia,	**PPK Sungai dan Pantai II,**
Bernard Hendra Wentinusa	**Rangga Ardiansah, S.H., S.T**
Pimpinan Cabang	NIP. 19780331 200911 1 002

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR
WS. PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu (94114), Telp. (0451) 482147 Fax (0451) 482101

Nomor : SA0401/SP.II-PJSA.ST/Bws13/13
Sifat : Segera
Lampiran : 1 lembar
Hal : Persiapan PHO

Palu, 10 Februari 2022

Yth. PT. KARYA PEMBANGUNAN REZKI
di Palu

Sehubungan dengan Pelaksanaan *River Improvement and Sediment Control In Paneki River* kontrak pekerjaan nomor : HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/17 tanggal 05 Oktober 2020, maka dengan ini kami memerintahkan kepada Saudara agar segera melaksanakan percepatan progres pekerjaan dan melengkapi laporan hardcopy dan softcopy yang terlampir di check list.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUNGAI DAN PANTAI II,

RANGGA ARDIANSAH , SH, ST
NIP. 19780331 200911 1002

Tembusan :
1. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu;
2. Kasie Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu;
3. Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS. Palu - Lariang, WS. Parigi - Poso, WS. Kaluku - Karama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Arsip.

CHECK LIST DOKUMEN

Nama Paket : River Improvement And Sediment Control In Paneki River
Kontraktor : PT. KARYA PEMBANGUNAN REZKI

NO	Jenis Dokumen	Jumlah Hardcopy	Softcopy ada/tidak	Keterangan
1	Back Up Data			
	- Back Up Data MC 0	Buku		
	- Back Up Data MC I	Buku		
	- Back Up Data MC II	Buku		
	- Back Up Data MC III	Buku		
	- Back Up Data MC 100%	Buku		
	- Payment 1	Buku		
	Payment 2	Buku		
	- Payment 3	Buku		
	- Payment 4	Buku		
	- Payment 5	Buku		
	- Payment 6	Buku		
	- Payment 7	Buku		
2	Progress Report			
	- Montaly Progress Report (Oktober 2020 - Februari 2022)	Buku		per bulan 5 rangkap
	- Weekly Progress Report (Oktober 2020 - Februari 2022)	Buku		per bulan 5 rangkap
	- Daily Progress Report (Oktober 2020 - Februari 2022)	Buku		per bulan 5 rangkap
3	Dokumentasi & Gambar			
	- Photo Dokumentasi (General View)	Buku		
	Photo Dokumentasi (CD/VCD)	Keping		
	- Video Drone	File		
	- Working Drawing	Buku		
	- As Build Drawing	Buku		
4	Lain-Lain			
	- Time Schedule	Lembar		
	- Laporan Uji Mutu	Buku		
	- Surat Keterangan Bebas Pajak Gol. "C"	Lembar		
	- Surat Pernyataan Bebas Hutang	Lembar		
	Request & Approval	Buku		

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR
WS. PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu (94114), Telp. (0451) 482147 Fax (0451) 482101

Nomor : SA0401/SP.II-PJSA.ST/Bws13/14 Palu, 14 Februari 2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Pemberitahuan Tindaklanjut Penyelesaian Pekerjaan *River Improvement and Sediment Control in Paneki River*

Yth. Pimpinan Cabang PT. Karya Pembangunan Rezki
Di Palu

Sehubungan dengan Masa Kontrak pekerjaan *River Improvement and Sediment Control in Paneki River*, Kontrak Pekerjaan Nomor : HK0201/PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/17 tanggal 05 Oktober 2020, yang akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2022 dengan progres realisasi baru mencapai 95,92%. Oleh karena Penyedia dianggap mampu untuk menyelesaikan pekerjaan, maka dengan ini kami sampaikan tindaklanjut penyelesaian pekerjaan tersebut di atas dengan **Pemberian Kesempatan** yang disertai **Denda** sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Bagian B6 Pasal 45 tentang Pemberian Kesempatan yang kemudian akan dimuat dalam Adendum Kontrak (SSUK Bagian B6 Pasal 45 Butir 45.2) yang di dalamnya mengatur:

a. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan (sampa dengan 50 HK sejak masa pelaksanaan berakhir, SSUK Bagian B6 Pasal 45 Butir 45.3);
b. Pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia Jasa (sebesar 1/1000 dari harga kontrak setiap harinya, SSUK Bagian F Pasal 68 Butir 68.4)
c. Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan;dan
d. Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUNGAI DAN PANTAI II,

RANGGA ARDIANSAH, SH., ST
NIP. 19780331 200911 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu.
2. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS. Palu - Lariang, WS. Parigi - Poso, WS. Kaluku - Karama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Arsip

PT. KARYA PEMBANGUNAN REZKI
GENERAL CONTRACTOR DAN PERDAGANGAN UMUM
Alamat : Jalan Jati Jaya Nomor 02 Palu – Sulawesi Tengah

Sigi, 14 Februari 2022

Nomor : 59/PT.KPR/Permut/II/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pemberian Kesempatan

Kepada
Yth. PPK Sungai dan Pantai II
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan River Improvement and Sediment Control in Paneki River, Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dengan nomor kontrak : HK0201.PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/17 Tanggal 05 Oktober 2020, addendum 01 nomor : HK0201.PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/18 Tanggal 01 Februari 2021, addendum 02 nomor : HK0201.PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/51 Tanggal 11 Mei 2021, addendum 03 nomor : HK0201.PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/105 Tanggal 29 September 2021, addendum 04 nomor : HK0201.PPK-SDPII-PJSA.ST-BWS13/130 Tanggal 30 November 2021, yang saat ini masih menyelesaikan sisa pekerjaan , maka dengan ini kami mengajukan **permohonan pemberian kesempatan** kepada PPK Sungai dan Pantai II untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Sekaligus melakukan joint inspeksi dalam rangkaian MC.100% dan PHO Pekerjaan sebelum menutup saluran yang menjadi akses alat masuk dan keluar dari sungai.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih

Kontraktor Pelaksana
PT. Karya Pembangunan Rezki

Bernard Hendra Wentinusa, ST
Direktur Cabang

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR
WS. PALU-LARIANG, WS. PARIGI-POSO, WS. KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Abd. Rahman Saleh No. 230 Palu (94114), Telp. (0451) - 462147 Fax (0451) - 482101

Nomor : UM0102/PJSA.ST/Bws13/ Palu, 04 Maret 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Notulensi Rapat Pembahasan Rencana Adendum VI *River Improvement and Sediment Control In Paneki River*

Yth. Kepala BWS Silawesi III Palu
di Palu

Menindaklanjuti hasil Rapat Pembahasan Rencana Adendum VI *River Improvement and Sediment Control in Paneki River* yang telah dilaksanakan dengan Kepala Sub Direktorat Wilayah III, Direktorat Sungai dan Pantai pada tanggal 4 Maret 2022 dengan daring, dengan hormat kami sampaikan notulensi hasil pembahasan Penyelesaian Sisa Progres Pekerjaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala SNVT PJSA WS. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama
Provinsi Sulawesi Tengah

Radia Zulfikar, S.T., M.T
NIP 19731001 200212 1 005

Tembusan :
1. Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Sulawesi III di Palu;
2. PPK Sungai dan Pantai II;
3. Pimpinan Cabang PT. Karya Pembangunan Rezki.

NOTULEN RAPAT		
Judul : Rapat Pembahasan Rencana Adendum VI *River Improvement and Sediment Control in Paneki River*		**Notulen Rapat No.** : UM0102/PJSA.ST/Bws13/ Jumlah Halaman :
Lokasi Rapat : *Video Conference (Zoom Meeting) Direktorat Sungai dan Pantai Meeting ID*	**Tanggal** : 04 Maret 2022 **Waktu** : 10.00 WITA-Selesai	**Dibuat Oleh**: Dito Made Putranto RS., ST
Agenda : Pembahasan Sisa Progres dan Estimasi Waktu Penyelesaian Pekerjaan serta Rencana Pemberian Kesempatan Yang Disertai Denda	**Pimpinan Rapat** R. Nuzulina Ilmiaty., S.T., M.T	

Sehubungan dengan permohonan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan *River Improvement and Sediment Control in Paneki River*, telah dilakukan Rapat pembahasan rencana Adendum VI yang merupakan Pemberian Kesempatan yang di sertai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. **Status Pekerjaan :**
   A. Progres pekerjaan sampai saat ini (4 Maret 2022) sebesar 99.14% yang berarti memiliki deviasi 0.86%
   B. Uraian Pekerjaan yang belum terselesaikan:
   - Channel Work (Beton Siklop) belum selesai sepanjang 12 meter di sisi kiri sta 0+620 dengan sambungan parapet sepanjang 4 meter di sisi kiri sta 0+500, karena masih menjadi akses alat berat yang mengerjakan pengecoran parapet;
   - Pekerjaan Beton K225 pada parapet segmen 4 (layer top) pada Sta 0+566 - sta 0+578 sepanjang 12 meter sisi kanan, sta 0+500 sisi kiri sepanjang 1 meter sisi kiri, Sta 0+521 sepanjang 11 meter sisi kiri dan sta 0+610 sepanjang 2 meter sisi kanan dan sisi kiri;
   - Perapihan timbunan penahan tanggul dari sta 0+860 sampai dengan sta 20+020 serta beberapa timbunan pada titik box culvert dan bangunan Konsolidasi Dam;
   - Pemasangan batu boulder di area hilir sepanjang 6 meter sisi kiri yang digunakan sebagai akses alat berat masuk ke sungai untuk mengangkat sisa sedimen di badan sungai;
   - 2 buah Box Culvert di sisi kiri sta 0+620 belum terpasang karena masih di jadikan akses keluar masuk alat berat ke sungai dalam pekerjaan parapet, dan 1 buah Box Culvert di sisi kanan STA 0+480;
   - 4 titik box culvert yang dalam tahap penyelesaian berada pada sta 2+500 sisi kanan outlet, sta 0+860 sisi kanan outlet, sta 1+770 sisi kiri outlet dan sta0+180 sisi kanan inlet.
2. **Target Penyelesaian Pekerjaan :**
   - Estimasi waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 11 maret 2022 (yang seharusnya kontrak berakhir pada tanggal 15 Februari 2022;
   - Rencana Pemberian Kesempatan yang disertai denda keterlambatan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak selama 50 hari kalender (terhitung sejak 16 Februari 2022 sampai dengan 6 April 2022);
   - Pekerjaan Parapet akan di selesaikan sejak tanggal 3-9 maret 2022;
   - Pekerjaan Channel Work akan di selesaikan sejak tanggal 8-10 maret 2022;
   - Pekerjaan timbunan tanah akan di selesaikan sejak tanggal 4-10 maret 2022;
   - Penyusunan batu boulder dikerjakan secara parallel dengan focus perapihan timbunan area hilir, estimasi tanggal 7-10 maret 2022;
   - Finishing pekerjaan Jembatan desa pada tanggal 3-5 maret 2022
   - Penyelesaian pekerjaan Box Culvert pada tanggal 6-10 maret 2022

3. **Arahan Kasubdit Wilayah III Dit. Sungai dan Pantai (Ibu R. Nuzulina, ST., MT) :**
   - Mengingat kekurangan penyelesaian pekerjaan yang sangat kecil (tidak sampai 1%), agar PPK dapat terus mendorong Penyedia Jasa untuk menyelesaikan pekorjaan di lapangan sampai tuntas;
   - Agar dipastikan Penyedia Jasa dapat mengikuti mekanisme denda sesuai dengan yang telah di tentukan dalam dokumen kontrak untuk pekerjaan yang telah melewatu batas waktu.
4. **Kesimpulan :**
   Berdasarkan Syarat syarat umum dan khusus kontrak maka penyedia jasa di berikan kesempatan untuk menyelesaikan selama maksimal 50 Hari kalender dengan pemberian denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang akan di potong secara langsung pada tagihan termin.
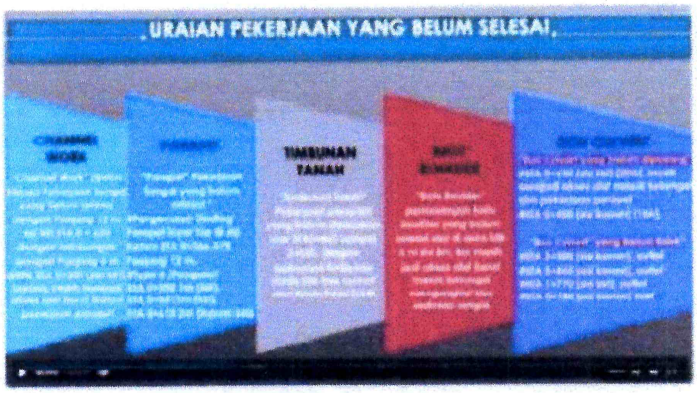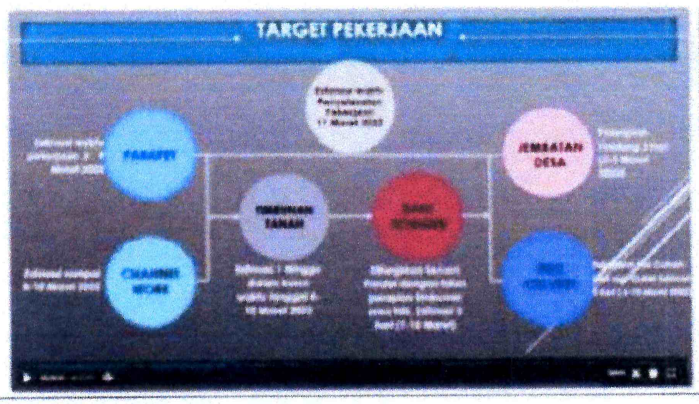
DOKUMENTASI RAPAT
